

Logboek Lakerveld, MFA Het Rak Gouderak.

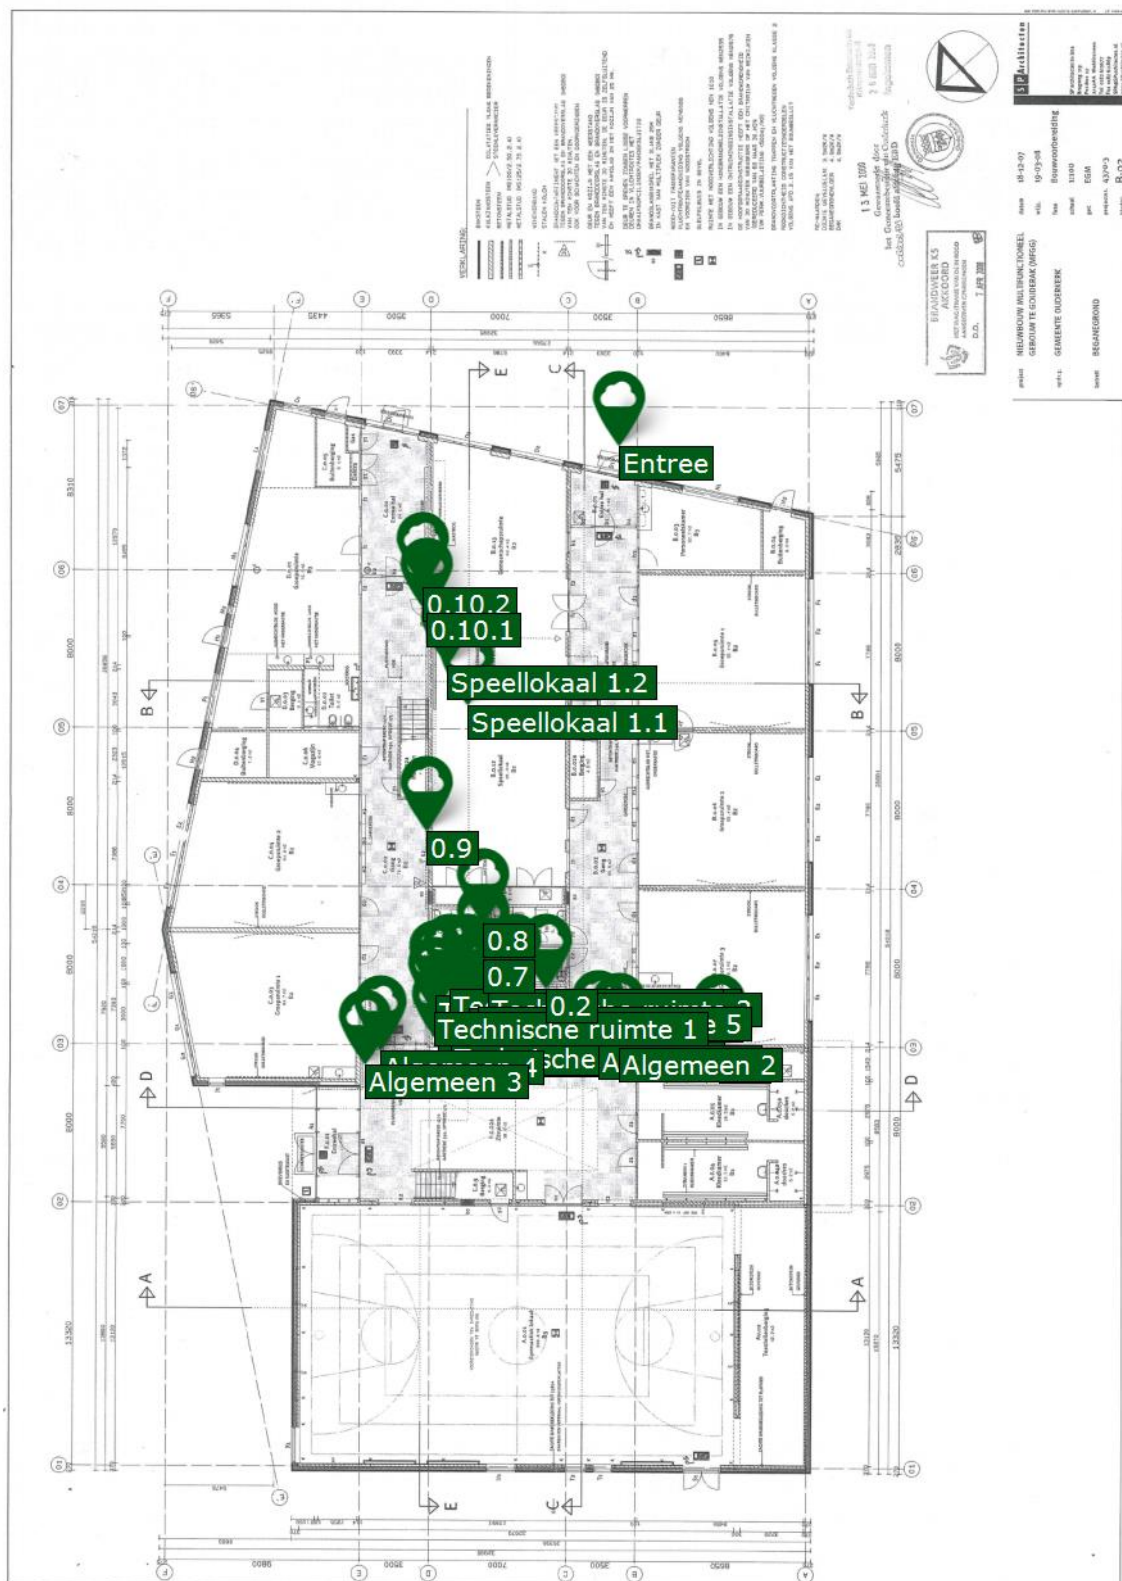
Logboek bouwkundige brandveiligheid.



Rondes

Ronde: Opnamen bouwkundige brandveiligheid	
Gemaakt op	20-01-2025
Gemaakt door	Brand-Veilig Totaalaanpak b.v. - Projecten Brand-Veilig


10.01 plattegronden begane grond Rak.pdf - Pagina 1





Formulieren/snags op tekening


Groep	Formulieren/snags
Niet gegroepeerde formulieren/snags	Technische ruimte 9, Technische ruimte 2, Technische ruimte 7, Technische ruimte 8 , Speellokaal 1.2, Speellokaal 1.1, 0.10.2, 0.10.1, Technische ruimte 3 , Technische ruimte 6, Technische ruimte 5, Technische ruimte 4, Technische ruimte 1, Algemeen 4, Algemeen 3, Algemeen 1, Algemeen 2, Entree, 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 0.8, 0.9


Entree 		
Status	Afgerond	


Algemeen 2 			
Locatie	Gang		
WBDBO	30 min.		
Type brandscheiding	Lichte scheidingswand		
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND		
Omschrijving	Kabelgoot 250 mm breed brandwerend afgewerkt		
Status	Afgerond		
			


Algemeen 3 	  
Locatie	Gang
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Lichte scheidingswand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND
Omschrijving	Kabelgoot 250mm breed brandwerend afgewerkt
Status	Afgerond


0.10.1 	  
Locatie	Gang-lokaal
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND
Omschrijving	Kabelgoot dichtgezet+aangewerkt
Status	Afgerond

Algemeen 1 	  
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND > W Metalen buis met luchtkanaal/brandklep
Omschrijving	Brandklep aangewerkt
Status	Afgerond


Algemeen 4 	  
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND > W Kabelgoten / Kabelladders
Oplossing	kabelgoot 30 minuten brandwerend met Nullifire FS702 Brandwerende Acrylaatkit
Prioriteit	Hoog
Status	Afgerond

Technische ruimte 1 	  
WBDBO	30 min.
Omschrijving	Gasleiding brandwerend aangewerkt met fireboard icm isolatiedeken
Status	Afgerond


Technische ruimte 4 	  
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND > W Metalen buis ongeïsoleerd
Omschrijving	Stalen doorvoer aangewerkt met isolatiedeken icm fs702 acrylaatkit
Status	Afgerond


Technische ruimte 5 	  
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND
Omschrijving	Elektra doorvoer aangewerkt met brandwerende coating icm. Fs702
Status	Afgerond

Technische ruimte 6 	  
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND
Omschrijving	Circa 3 meter fs702
Status	Afgerond


Technische ruimte 3 	  
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND > W Metalen buis met luchtkanaal/brandklep
Omschrijving	Vlinderklep 120 in het luchtkanaal geplaatst
Status	Afgerond


Technische ruimte 2 	  
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND > W Meerlagen alupex buis met Armaflex / elastomeerisolatie
Oplossing	meerlagen alupex buis brandwerend met Nullifire FS709 Brandwerende Grafietkit
Status	Afgerond

Technische ruimte 7 	  
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND > W Kunststof buis tot 125mm
Omschrijving	Pvc 50 mm aangewerkt om de sparing met fs709 grafietkit
Status	Afgerond


Technische ruimte 8 	  
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND > W Kabelgoten / Kabelladders
Omschrijving	Kabelgoot aangewerkt en dichtgezet met fireboard en coating
Status	Afgerond
	



Technische ruimte 9 	  
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND > W Flexbuis met kabel(s)
Omschrijving	Pex 25 mm aangewerkt met grafietkit fs709
Status	Afgerond

0.10.2 	  
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND
Omschrijving	Naad aangewerkt met fs702
Status	Afgerond

Speellokaal 1.1 	  
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Voegaansluiting VLOER > Massieve wand met betonnen vloer
Oplossing	voeg brandwerend met Nullifire FS702 Brandwerende Acrylaatkit
Omschrijving	9 meter voegaansluiting
Status	Afgerond



Speellokaal 1.2 	  
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND > W Flexbuis met kabel(s)
Status	Afgerond


0.2 	  
Locatie	Toiletten
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Voegaansluiting WAND
Omschrijving	Naad wand aansluiting met pur afgewerkt, dit is geen brandwerende pur 40mm lengte 2,5m1
Status	Afgerond
	

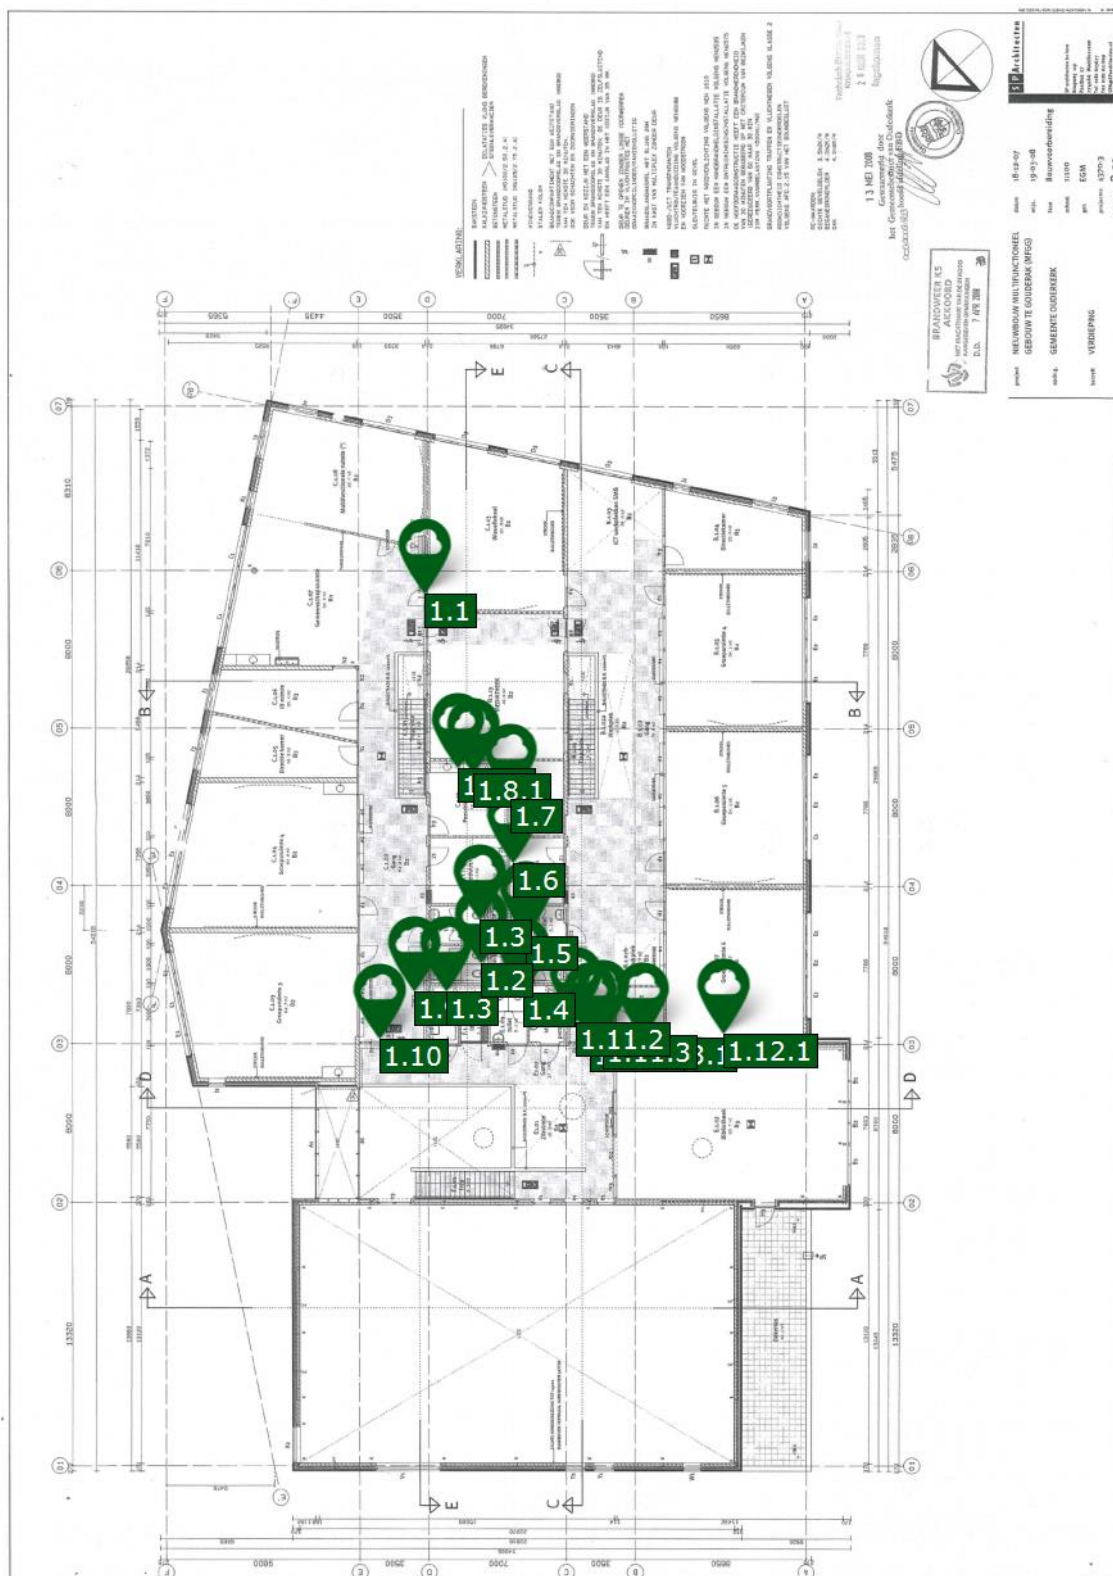
0.3 	  
Locatie	Toiletten
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND
Omschrijving	Naad wand aansluiting met pur afgewerkt, pur is niet brandwerend 40mm lengte 2.5m1. Sparing wand achter manchets open 80mm
Status	Afgerond
	

0.5	   
Locatie	Berging
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Lichte scheidingswand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Voegaansluiting WAND
Omschrijving	Naad wand aansluiting open en niet brandwerend afgewerkt
Status	Afgerond
	

0.7	   
Locatie	Toiletten
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND
Omschrijving	Naad wand aansluiting met pur afgewerkt, pur is niet brandwerend 40mm ca 2,5m1
Status	Afgerond
	

0.8		  
WBDBO	30 min.	
Type brandscheiding	Lichte scheidingswand	
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND	
Omschrijving	Naad wand aansluiting met pur afgewerkt, pur is niet brandwerend 40mm 2,5m1 afwerken	
Status	Afgerond	
		


0.9		  
Locatie	Gang	
WBDBO	30 min.	
Type brandscheiding	Steenachtige wand	
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND	
Omschrijving	Kabelgoot aangewerkt en bovenzijde dichtgezet	
Status	Afgerond	
		


10.01 plattegronden 1^{ste} Rak.pdf - Pagina 2


Formulieren/snags op tekening

Groep	Formulieren/snags
Niet gegroepeerde formulieren/snags	1.13.1, 1.12.1, 1.11.1, 1.11.3, 1.11.2, 1.8.2, 1.8.1, 1.10, 1.1, 1.2, 1.3, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9


1.8.1 	  
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND > W Flexbuis met kabel(s)
Omschrijving	Elektra aangewerkt met fs702 i.c.m coating
Status	Afgerond
	


1.8.2 	  
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	Kitvoegen
Oplossing	voeg brandwerend met Nullifire FS702 Brandwerende Acrylaatkit
Status	Afgerond


1.11.2 	  
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND > W Bundel losse kabels en E-leidingen
Oplossing	anders, zie omschrijving
Omschrijving	Elektra doorvoer aangewerkt er fs702 icm coating
Status	Afgerond

1.11.3 	  
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND > W Bundel losse kabels en E-leidingen
Omschrijving	Kabelbundel aangewerkt met fs702 icm coating
Status	Afgerond

1.11.1 	  
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Massieve vloer
Type doorvoer / voeg	Kitvoegen
Oplossing	voeg brandwerend met Nullifire FS702 Brandwerende Acrylaatkit
Omschrijving	3 meter
Status	Afgerond


1.12.1 	  
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	Kitvoegen
Oplossing	voeg brandwerend met Nullifire FS702 Brandwerende Acrylaatkit
Status	Afgerond

1.13.1 	 
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	Kitvoegen > Kitvoeg ontbreekt
Oplossing	voeg brandwerend met Nullifire FS702 Brandwerende Acrylaatkit
Omschrijving	2.5
Status	Afgerond

1.1 	 
Locatie	Gang-lokaal
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Lichte scheidingswand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND
Omschrijving	Naad wand aansluiting met pur, is niet brandwerend 40mm hoog en ca 11mm, div elektra, kunststof en stalen ligger ca 300x200 mm niet brandwerend afgewerkt
Status	Afgerond






1.10 	  
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Lichte scheidingswand
Type doorvoer / voeg	Kitvoegen
Oplossing	Naad wand brandwerend met Nullifire FS702 Brandwerende Acrylatkit
Status	Afgerond

1.2 	  
Locatie	Toiletten
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Lichte scheidingswand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND
Omschrijving	Naad wand aansluiting met pur, pur is niet brandwerend 400mm ca 2,5m1
Status	Afgerond
	


1.3 	  
Locatie	Toiletten
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Lichte scheidingswand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND
Omschrijving	Naad wand aansluiting met pur, pur is niet brandwerend 40mm ca 2,5m1
Status	Afgerond
	


1.3		  
Locatie	Berging	
WBDBO	30 min.	
Type brandscheiding	Steenachtige wand	
Omschrijving	Ruimte niet toegankelijk tijdens opnamen	
Status	Afgerond	
		

1.4		  
Locatie	Toiletten	
WBDBO	30 min.	
Type brandscheiding	Lichte scheidingswand	
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND	
Omschrijving	Naad wand aansluiting met pur is niet brandwerend 40mm en ca 4m1 lang	
Status	Afgerond	
		

1.5 	  
Locatie	Toiletten
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Lichte scheidingswand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND
Omschrijving	Naad wand aansluiting is niet brandwerend, pur verwijderen 40mm en ca 4m1 afwerken
Status	Afgerond
	

1.6 	  
Locatie	Opslag
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND
Omschrijving	Kabelgoot 250mm breed niet brandwerend, naad wand aansluiting met pur afgewerkt en niet brandwerend 5m1
Status	Afgerond
	

1.7 	  
Locatie	Berging
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Omschrijving	Naad gips/beton aansluiting gekit 4m 1 elektra doorvoer aangewerkt met fs702 icm coating
Status	Afgerond
	

1.9 	  
WBDBO	30 min.
Type brandscheiding	Steenachtige wand
Type doorvoer / voeg	0 NULLIFIRE Doorvoer WAND > W Kabelgoten / Kabelladders
Oplossing	kabelgoot 30 minuten brandwerend met Nullifire FS702 Brandwerende Acrylaatkit
Status	Afgerond
 	
